

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ

Volet 3 – Projet Signature

Parc régional de la Forêt-Drummond

Rapport final

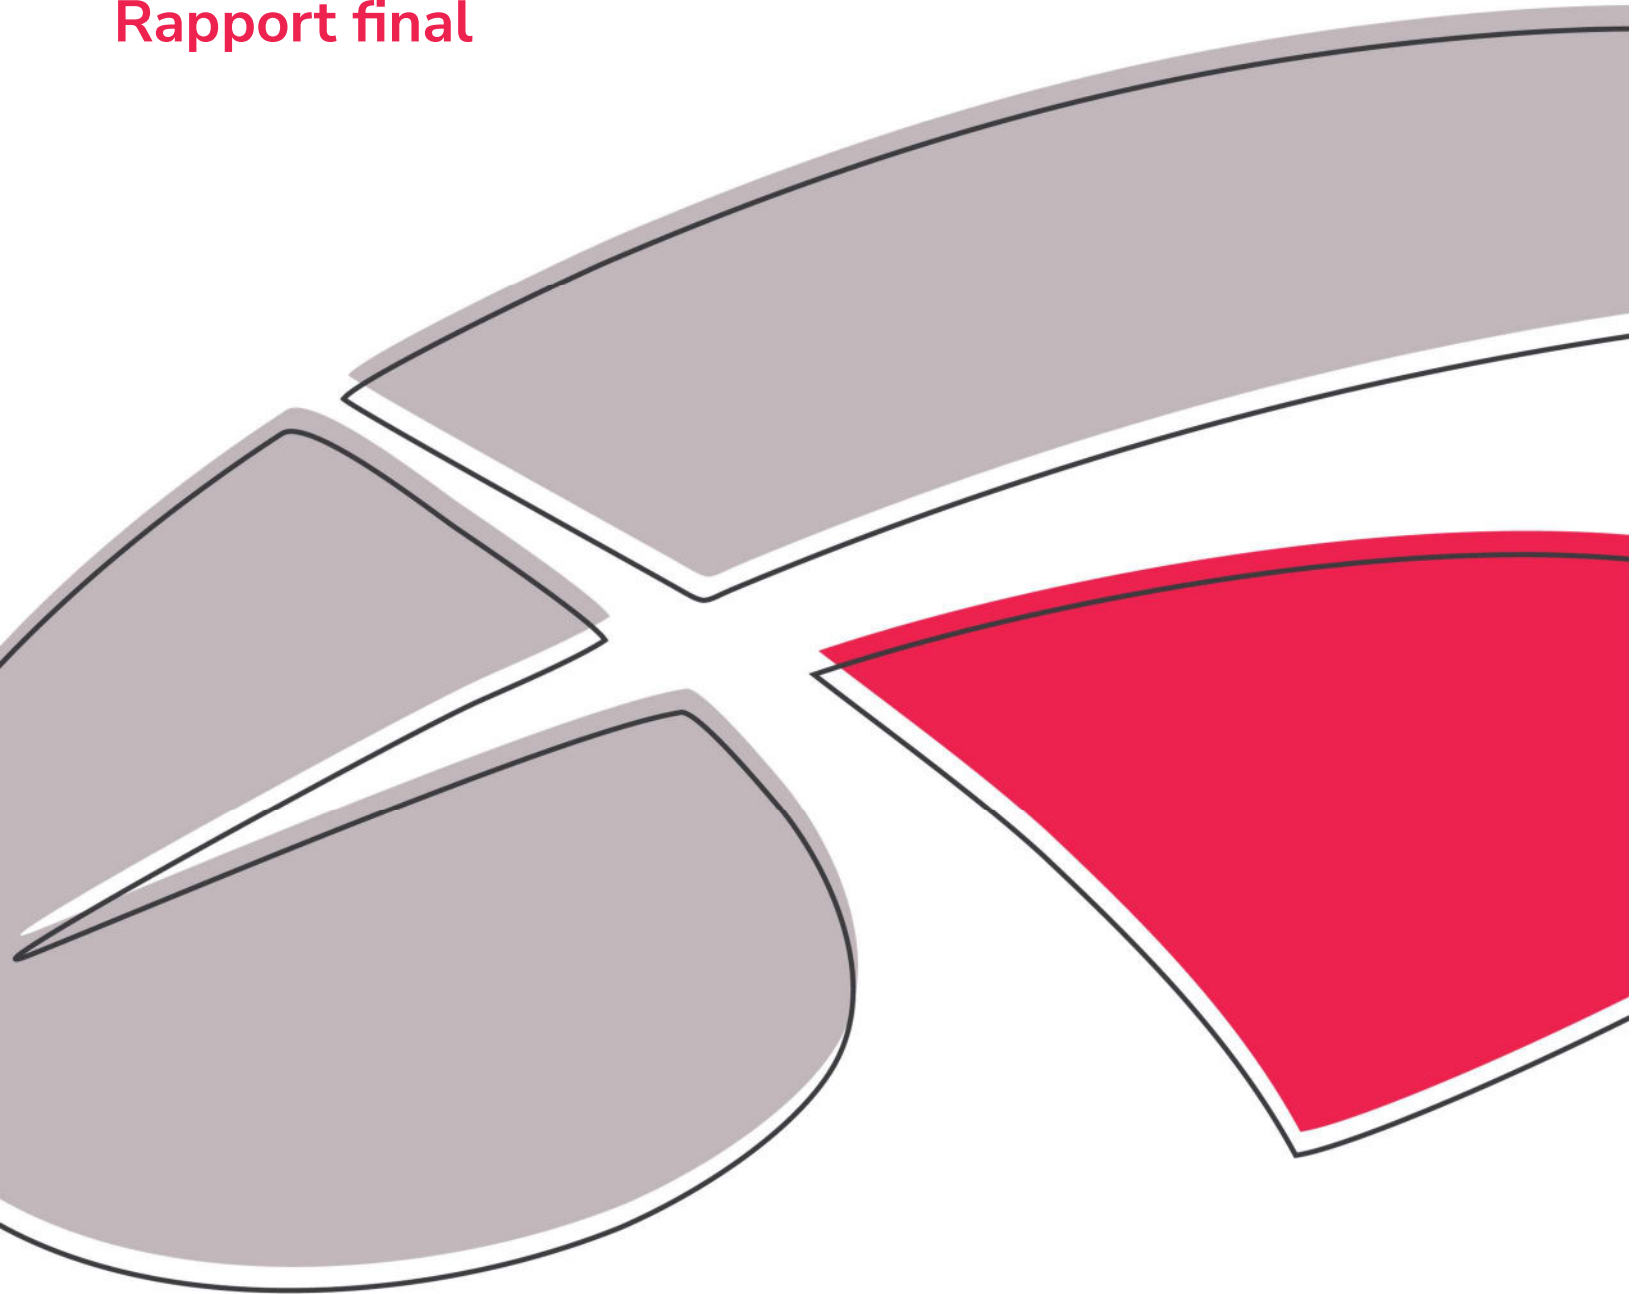


Table des matières

Mise en contexte.....3

Avis d'intérêt et rédaction du devis3

1. Avis d'intérêt3

2. Rédaction du devis et signature de l'entente.....4

Mise en œuvre de l'entente.....5

3. Comité directeur.....5

4. Cadre de gestion.....6

5. Réalisation du projet.....6

6. Gestion budgétaire.....7

7. Autres commentaires et évaluation.....9

Mise en contexte

FRR volet 3 - Projet Signature – Rapport final

À la dernière année de mise en œuvre du projet Signature « parc régional de la Forêt-Drummond » de la MRC de Drummond, un rapport final doit être produit conformément aux clauses 4.16 et 4.17 de l'Entente intervenue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH) et la MRC.

En plus du fichier de reddition de comptes d'utilisation des sommes à remettre, le rapport final doit présenter l'ensemble des activités réalisées dans le cadre de l'Entente.

Ce rapport final comprend les grandes sections à traiter conformément au canevas réalisé et fourni par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour ce Fonds.

Avis d'intérêt et rédaction du devis

Les premières étapes

La première étape qui menait à la signature de l'entente « Signature innovation » consistait à signifier au MAMH son intérêt à mettre en œuvre un projet. Avec cet avis d'intérêt, la MRC pouvait, si elle le souhaitait, obtenir un montant maximal de 50 000 \$, pris à même la somme attribuée pour l'année 2020-2021. Ce montant pouvait être utilisé pour définir le projet.

Par la suite, la définition du projet permettait à la MRC de compléter un devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation » préalablement à l'obtention de l'ensemble de l'enveloppe qui lui était attribuée.

La MRC devait y présenter les grandes lignes de son projet « Signature innovation », soit :

- › Une description du domaine d'intervention;
- › Les principaux objectifs;
- › Les principales initiatives ou étapes prévues;
- › Les mécanismes de suivi et de mise en œuvre prévue;
- › Ainsi que le montage financier préliminaire.

1. Avis d'intérêt

Comment s'est déroulée la réflexion?

Le 21 mai 2020, la préfète de la MRC de Drummond recevait une correspondance de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec annonçant à la MRC la possibilité de mettre en œuvre le volet

Projets « Signature innovation » des MRC afin de développer ou de consolider son identité territoriale de façon novatrice à partir d'un domaine d'intervention qu'elle identifiera.

Comme prévu dans le Partenariat 2020-2024, ce volet était doté d'une enveloppe annuelle de 25 M\$ répartie entre les territoires admissibles. Ainsi, la MRC bénéficiait alors d'une enveloppe annuelle de 398 949 \$ pour cinq ans, totalisant 1 994 745 \$ sur la période 2020-2024.

La réflexion de la MRC autour de la possibilité de réaliser un projet « Signature » à ce moment avait été celle d'orienter la totalité des sommes qui lui était allouée dans le projet du développement du parc régional de la Forêt-Drummond que la MRC venait tout juste de créer officiellement selon les règles édictées gouvernementales en avril 2020.

Ce programme arrivait à un moment opportun pour la MRC à cette étape charnière du développement de son nouveau parc régional. Il est important de rappeler que la MRC venait tout juste, en juillet 2018, d'acquérir d'Hydro-Québec et au coût de 5,4 M\$, près de 20 km² de forêt dans l'objectif de créer un parc régional.

L'opportunité que représentait à ce moment le volet 3 pour le développement du parc régional a fait l'unanimité au sein du conseil de la MRC et s'est concrétisée par l'envoi au MAMH, par la MRC, du formulaire d'avis d'intérêt à réaliser le projet Signature « parc régional de la Forêt-Drummond ».

2. Rédaction du devis et signature de l'entente

La réflexion autour du projet

Le conseil de la MRC a ainsi manifesté à nouveau son intérêt à mettre en valeur la Forêt-Drummond et indiqua alors au gouvernement qu'elle prioriserait le développement du parc régional de la Forêt-Drummond pour son projet « Signature ».

La présentation d'un devis des travaux relatifs au projet était préalable à la conclusion de l'Entente Signature, devis dans lequel la MRC devait présenter les grandes lignes de son projet. Rappelons qu'à ce moment, en 2020, la MRC était au début de l'élaboration du premier plan directeur du parc régional qui se retrouvait notamment admissible dans cette démarche Signature.

Trois (3) grands dossiers s'étaient alors retrouvés à évoluer de façon parallèle et intégrée, soit : l'élaboration du plan directeur du parc régional, la demande d'autorisation et de régularisation des usages à l'intérieur du parc régional à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ainsi que le volet Signature (sommes avec lesquelles la MRC pouvait potentiellement réaliser les actions et les projets de son plan directeur jusqu'en 2025).

La rédaction du devis a été réalisée selon les règles de l'Entente et les actions déposées ont été tirées des travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration du plan directeur, où ont été notamment réalisés des processus de consultations publiques autant au niveau des citoyens et citoyennes de la MRC qu'auprès de

différents partenaires. Bref, les grandes lignes du plan d'action du plan directeur ont été à ce moment transposées dans l'élaboration du devis de projet Signature.

Le tout réalisé selon les processus de gestion interne de l'organisation : processus administratifs, comité du parc régional et résolution d'adoption par le conseil. La MRC a également été accompagnée par les membres de la direction régionale du MAHM tout au long du processus d'élaboration du devis de projet.

Mise en œuvre de l'entente

Représentants et mandat

L'entente « Signature Innovation » exigeait la mise en place d'un comité directeur composé minimalement de représentants de chacune des parties (MRC et MAMH). Le mandat général de ce comité était de voir à l'application de l'entente, conformément aux normes et aux programmes applicables, et d'en assurer la gestion du suivi administratif et financier.

Le comité directeur était notamment chargé de :

- › Adopter les règles de fonctionnement;
- › Formuler un cadre de gestion et en recommander l'adoption par la MRC. Ce cadre comprenait :
 - o un plan d'action;
 - o le type de projets qui seraient privilégiés;
 - o les critères de sélection des projets;
 - o les taux et seuils d'aide applicables;
 - o les règles de gouvernance.
- › Valider et recommander à la MRC les initiatives, les projets ou les interventions devant bénéficier du soutien financier prévu dans le cadre de l'entente;
- › S'assurer de l'atteinte des objectifs de l'entente.

3. Comité directeur

La composition du comité

Le comité directeur de l'Entente a été bâti selon la cadre de gestion et les règles de fonctionnement de l'Entente. Des élu.e.s, membres de la direction ainsi que la coordination du parc régional ont composé le comité, incluant également les représentants du MAMH. Le cadre de gestion de l'Entente ainsi que la

composition du comité se devait également d'être adopté par résolution ainsi qu'être affiché sur le site Web de la MRC.

Pour la première année et selon les critères du MAMH, trois rencontres du comité directeur étaient prévues : la première au début de l'Entente afin de préciser les orientations de celle-ci et d'établir les modalités de fonctionnement, le plan de travail et le cadre financier; la seconde en milieu d'année visant à faire le point sur l'avancement des projets et le suivi financier et la troisième en fin d'année financière pour la reddition de comptes et la planification de l'année à venir.

Pour les années subséquentes, deux rencontres étaient à prévoir par année : la première à mi-parcours visant à faire le point sur l'avancement des projets et le suivi financier et la seconde en fin d'année financière pour la reddition de comptes et la planification de l'année subséquente (sauf pour la dernière année).

4. Cadre de gestion

Déroulement du cadre

La rédaction du cadre de gestion de l'Entente a été réalisée selon les modèles remis du ministère ainsi qu'avec l'accompagnement des représentants de celui-ci. Le cadre de gestion a permis de garder le cap sur les montants de contributions financières, les budgets, les plans de travail annuel, les redditions et les versements, notamment.

Au cours des années subséquentes de l'adhésion au volet Signature, le cadre de gestion de l'Entente s'est également vu modifié et le comité directeur de l'Entente Signature a été fusionné aux rencontres du comité directeur du parc régional de la Forêt-Drummond de la MRC, optimisant ainsi les processus décisionnels et de suivis ainsi que le nombre de rencontres annuellement.

Les rencontres sont alors passées à environ 5 rencontres de comité en moyenne, soit de 4 à 7 rencontres par années, permettant ainsi au comité de suivre de près la planification et l'atteinte des objectifs de l'Entente.

5. Réalisation du projet

Les actions réalisées

La réalisation du projet « développement du parc régional de la Forêt-Drummond » s'est déroulée en grande partie dans les temps. À noter que la MRC, et comme pour certaines autres MRC de la province, s'est également accommodée d'un avenant de prolongation de 1 an offert par le MAMH afin de compléter son projet.

Deux grands projets ont été distinctifs de l'aide financière Signature, soit le projet d'aménagement d'un réseau de sentiers de vélo de montagne cross-country de 27.5 kilomètres et l'aménagement d'un réseau de sentiers de randonnées pédestres de 14 kilomètres. Chacun de ces deux réseaux de sentiers devient ainsi identitaire de chacune des deux rives de la rivière Saint-François qui scindent le territoire en deux.

Une ressource additionnelle, soit une chargée de projet, en ajout à la coordination du parc régional avait notamment été embauchée pour venir renforcer la mise en œuvre des projets. Cependant la ressource n'est pas demeurée en poste et celui-ci n'a pas été renouvelé par l'organisation. L'ensemble du projet a alors cheminé à travers la coordination du parc régional.

Le leadership des élus dans la mise en œuvre du projet s'est également concrétisé par le traitement des différents projets et de leurs recommandations pour adoption au conseil de la MRC.

Pour ce qui est du milieu, celui-ci a été sollicité par les diverses consultations publiques et sondages qui ont été menés et qui ont teinté le plan directeur ainsi que son plan d'action. À noter que les projets du plan d'action ont en grande partie été financés et réalisés par l'entremise du volet Signature, dont notamment les frais pour l'élaboration du plan directeur par une firme spécialisée.

6. Gestion budgétaire

Les objectifs réalisés

Au niveau des prévisions et des dépenses finales, les résultats ont été sommes toutes balancés et ont remplis l'esprit et les objectifs du projet. Des écarts ont tout de même été observés lesquels s'appuient sur diverses explications :

Accessibilité / stationnements : devis 300 000\$, résultat 37 069\$. Explications : la MRC a obtenu une autre aide financière de 190 000\$ pour l'aménagement de l'un de ses principaux points d'accès au parc régional (stationnement), ce qui lui a permis de faire des économies « Signature ».

Voies cyclables et piétonnières : devis 400 000\$, résultat 202 414\$. Explications : davantage de sommes ont été requises du côté de l'aménagement des sentiers pédestres et de vélo de montagne.

Vélo de montagne et vélo sur neige : devis 400 000\$, résultat 883 072\$. Explications : les coûts d'aménagements ont été sous-estimés dans les prévisions versus les coûts d'aménagements du marché qui ont également explosé suivant la période covid, notamment.

Randonnée pédestre : devis 300 000\$, résultant 696 9325\$. Explications : les coûts d'aménagements ont été sous-estimés dans les prévisions versus les coûts d'aménagements du marché qui ont également explosé suivant la période covid, notamment.

Canot-Kayak : devis 50 000\$, résultat 0\$. Explications : aucun aménagement n'a été réalisé pour les sports de pagaies à cette étape-ci du développement du parc régional. La somme assignée a bénéficié à d'autres projets.

Équipements et machineries : devis 150 000\$, résultat 59 535\$. Explications : le parc régional a plutôt opéré en sous-traitance pour les travaux à ce jour ce qui a réduit cette prévision de dépense. Les sommes assignées ont bénéficié à d'autres projets.

Communication : devis 50 000\$, résultat 5 821\$. Explications : un site internet parc régional était envisagé afin de consolider les premières années de développement du parc régional ainsi que la fin de ce programme, ce qui n'a finalement pas été retenu comme projet à réaliser. La balance des sommes assignées a bénéficié à d'autres projets.

Infrastructure en bâtiment / entrepôt : devis 300 000\$, résultat 0\$. Explications : aucune infrastructure n'a été bâtie à ce jour pour le parc régional. La MRC loue présentement, pour ses opérations, des locaux pour ses équipements. La balance des sommes assignée a bénéficié à d'autres projets.

Acquisition de terrain : devis 90 000\$, résultat 15 882\$. Explications : Plusieurs acquisitions stratégiques ont été effectuées avec des organismes de types davantage publics. Les transactions étaient pour des petits lots ainsi que pour des cessions avec souvent que seulement les frais d'arpentage et de notaire a défrayés. Aucune opportunité pour de grandes propriétés avec le privé ne s'est présentée. La balance des sommes assignées a bénéficié à d'autres projets.

Plan d'aménagement et entretien forestier : devis 30 000\$, résultat 15 882\$. Explications : 2 plans d'aménagement d'envergure sur 3 ont été réalisés. Le 3^e, non encore réalisé, se financera à même les revenus de coupe forestière. La balance des sommes assignées a bénéficié à d'autres projets.

Étude, rapport d'expertise et autres : devis 43 373\$, résultat 124 475\$. Explications : les prévisions étaient basées sur les coûts d'élaboration du plan directeur du parc régional et de la demande à la CPTAQ. Cependant, en cours de programme, d'autres études et rapports ont été demandés par le comité directeur et ont réalisé.

Temps ressources MRC : devis 80 321\$, résultat 0\$. Explications : l'ensemble du temps ressources de la MRC a finalement et en cours de programme, été admissible dans la contribution à l'Entente de 20% de la MRC. La balance des sommes assignées a bénéficié à d'autres projets.

L'ensemble des initiatives financées ont permis d'atteindre des objectifs liés à l'Entente ainsi qu'à des objectifs liés à la création et le développement du parc régional de la Forêt-Drummond. Bref, le volet Signature à jouer un rôle déterminant dans le développement des 5 premières années de vie de ce nouveau parc régional en lui permettant de structurer plus rapidement sa création ainsi que son offre de départ.

7. Autres commentaires et évaluation

Résultats et retombées

Le résultat du volet Signature est définitivement un succès. Bien que le coût des aménagements des activités de sentiers ait été plus élevé qu'envisagé pour différentes raisons hors du contrôle de la MRC (COVID-19, inflation, augmentations fulgurantes des coûts du marché lors des dernières années), la MRC a pu jeter des bases solides et représentatives de l'utilisation effectuée par le passé par les usagers. Bref, le parc régional a pu standardiser les bases de sa réelle identité.

La MRC a également pu compter sur un accompagnement concret, et ce, tout au long du programme par le bureau de la Direction régionale du Centre-du-Québec du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et plus précisément par l'entremise de la présence de la directrice régionale sur le comité directeur de l'Entente, intégré au fil des années, à même les rencontres du comité directeur du parc régional de la MRC.

En résumé, le volet Signature a contribué fortement et distinctivement au développement du nouveau parc régional de la Forêt-Drummond, et ce, à son étape charnière de développement et dès sa création. De par les investissements importants que cette aide financière a apportés, la MRC a pu jeter des bases solides et structurer les principales activités de sentiers du parc régional, tel que pour le vélo de montagne cross-country et la randonnée pédestre, notamment.

Les cinq premières années d'existence du parc régional de la Forêt-Drummond et pour lequel le programme Signature a fortement contribué, inscrivent définitivement maintenant le parc régional comme une identité territoriale forte de la MRC qui contribuent autant à l'apport économique, au tourisme ainsi qu'à la qualité du milieu de vie des citoyens et citoyennes de la région.

À court terme, le Volet Signature aura contribué significativement à l'écriture des premières pages de l'histoire d'un tout nouveau parc régional doté d'un fort potentiel futur et les impacts seront assurément observés à long terme. Ce projet résulte déjà des retombées qui seront les bases de davantage de retombées positives futures. Il en revient maintenant à la MRC de Drummond de poursuivre son travail afin de développer et de protéger ce territoire pour les générations futures et de contribuer au bien-être des citoyennes et citoyens de la MRC et d'ailleurs en leur facilitant l'accès à la nature en toutes saisons pour la pratique d'activités de plein air (*mission du parc régional de la Forêt-Drummond*).

Au nom de tous ceux et toutes celles qui en bénéficient aujourd'hui et qui en bénéficieront demain...

Merci!

ÉQUIPEMENTS ET MACHINERIES									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Roue à mesurer	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	104,98 \$	104,98 \$	104,98 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Planteur à piquet à gaz	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 194,59 \$	1 194,59 \$	1 194,59 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Panier de transport pour VTT	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	172,12 \$	172,12 \$	172,12 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Sangles à crochet (2) pour remorque et VTT	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	54,57 \$	54,57 \$	54,57 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Casque VTT et kit de verrou de remorque	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	179,49 \$	179,49 \$	179,49 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Caméras de surveillance Sppoint pour travaux (3)	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	409,42 \$	409,42 \$	409,42 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Supports à caméra de surveillance (3)	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	47,21 \$	47,21 \$	47,21 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Coupe herbe accessoire Kombi Stihl et fil	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	141,63 \$	141,63 \$	141,63 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Niveleuse de sentier LM48 pour VTT	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 228,35 \$	1 228,35 \$	1 228,35 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Casque VTT et miroirs pour VTT	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	220,41 \$	220,41 \$	220,41 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Ford F-150 véhicule de travail	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	51 291,62 \$	51 291,62 \$	51 291,62 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Équipements pour véhicule de travail F-150	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 166,04 \$	2 166,04 \$	2 166,04 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Surfaceuse à sentier hivernal LeMark Série-pro 60	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	913,39 \$	913,39 \$	913,39 \$	Oui
OUTILS DE COMMUNICATION ET D'INTERPRÉTATION									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	3 flags promotionnels pour salon, conférence, etc.	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 963,27 \$	1 963,27 \$	1 963,27 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Lettrage du véhicule de travail F-150	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	262,47 \$	262,47 \$	262,47 \$	Oui
ACQUISITION DE TERRAIN									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Lotissement lot 6 456 598 acquisition Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 784,79 \$	1 784,79 \$	1 784,79 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Acte de cession notarié lot 6 456 598 Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 049,88 \$	1 049,88 \$	1 049,88 \$	Oui
ÉTUDES, RAPPORT D'EXPERTISE ET HONORAIRES PROFESSIONNELS									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Plan directeur RCGT 70% du coût	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	24 656,31 \$	24 656,31 \$	24 656,31 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Demande CPTAQ 1/3 facture TCJ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	5 249,38 \$	5 249,38 \$	5 249,38 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Avis ingénieur forestier CPTAQ-SSAD	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	5 131,26 \$	5 131,26 \$	5 131,26 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Évaluation valeur locative DB évaluateur	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 414,71 \$	2 414,71 \$	2 414,71 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Demande CPTAQ 2/3 facture TCJ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	7 874,06 \$	7 874,06 \$	7 874,06 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Guide d'aménagement piétons cyclistes Vélo Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	83,99 \$	83,99 \$	83,99 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Plans et devis dimensionnement ponceau #1 01-50%	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 574,81 \$	1 574,81 \$	1 574,81 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Plans et devis dimensionnement ponceau #2 02-50%	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 574,81 \$	1 574,81 \$	1 574,81 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Consultant vélo de montagne Agence Lemerise	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 051,99 \$	3 051,99 \$	3 051,99 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Demande CPTAQ 3 de 3 facture TCJ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 630,47 \$	3 630,47 \$	3 630,47 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Document complémentaire CPTAQ TCJ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 364,84 \$	1 364,84 \$	1 364,84 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Caractérisation milieux naturels sentiers vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	7 411,49 \$	7 411,49 \$	7 411,49 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Services complémentaires CPTAQ TCJ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	375,33 \$	375,33 \$	375,33 \$	Oui

FRAIS ADMINISTRATIF									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Machine à laminier et pochettes affichage travaux	Frais d'administration de l'entente (MRC)	167,12 \$	167,12 \$	167,12 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Agrafeuse et agrafes affichage travaux	Frais d'administration de l'entente (MRC)	33,58 \$	33,58 \$	33,58 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Système de repérage TAG pour véhicule F-150	Frais d'administration de l'entente (MRC)	367,40 \$	367,40 \$	367,40 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	Permis installation ponceau Ville de Drummondville	Frais d'administration de l'entente (MRC)	30,00 \$	30,00 \$	30,00 \$	Oui
TEMPS RESSOURCES									
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	MRC temps ressources coordonnateur parc régional	Planification et concertation	38 863,64 \$	38 863,64 \$	38 863,64 \$	Oui
MRC de Drummond	2021-2022	MRC de Drummond	Organisme municipal	MRC temps ressources chargée de projet parc régional	Planification et concertation	21 035,67 \$	21 035,67 \$	21 035,67 \$	Oui
ACCESSIBILITÉ ET STATIONNEMENTS									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Travaux abattage et élagage stationnement Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 359,60 \$	3 359,60 \$	3 359,60 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Travaux retrait souches stationnement Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 663,25 \$	2 663,25 \$	2 663,25 \$	Oui
VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Géotextile aménagement ponceau #2 voies cyclables	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	151,66 \$	151,66 \$	151,66 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Tuyau ponceau #2 36X30 boucle des Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 461,96 \$	2 461,96 \$	2 461,96 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage voie cyclable secteur Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 023,64 \$	3 023,64 \$	3 023,64 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Remplacement ponceau boucle des Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	4 616,41 \$	4 616,41 \$	4 616,41 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Apport poussière de pierre section Canards illimités	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	8 415,04 \$	8 415,04 \$	8 415,04 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Réaménagement ponceau voie cyclable chemin du milieu	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	6 604,54 \$	6 604,54 \$	6 604,54 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage forestier chemin du milieu	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	10 194,29 \$	10 194,29 \$	10 194,29 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage forestier voie cyclable Saint-Majorique	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	4 131,26 \$	4 131,26 \$	4 131,26 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage forestier voie cyclable Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	4 131,26 \$	4 131,26 \$	4 131,26 \$	Oui
VELO DE MONTAGNE ET VÉLO SUR NEIGE									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #1	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	157 481,25 \$	157 481,25 \$	157 481,25 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #2	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	104 987,50 \$	104 987,50 \$	104 987,50 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #4	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 727,04 \$	1 727,04 \$	1 727,04 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #3	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	61 247,40 \$	61 247,40 \$	61 247,40 \$	Oui
ÉQUIPEMENTS ET MACHINERIES									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Ramasse-déchets (7) Uline	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	191,08 \$	191,08 \$	191,08 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Outils divers (cric ,échelle, sécateur, jeu de douille, sceaux)	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	566,82 \$	566,82 \$	566,82 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Extracteur à poteaux	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	401,58 \$	401,58 \$	401,58 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Lame de débroussaillseuse Kombi Stihl	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	146,97 \$	146,97 \$	146,97 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Extension pôle d'élagage Kombi Stihl	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	104,98 \$	104,98 \$	104,98 \$	Oui
OUTILS DE COMMUNICATION ET D'INTERPRÉTATION									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Achat photos photographe professionnel Productions OTG	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	220,47 \$	220,47 \$	220,47 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Panneaux signalisations Vous êtes ici	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	580,40 \$	580,40 \$	580,40 \$	Oui

PLAN D'AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN FORESTIER									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage digue marais Canards illimités	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	9 837,33 \$	9 837,33 \$	9 837,33 \$	Oui
ÉTUDES, RAPPORT D'EXPERTISE ET HONORAIRES PROFESSIONNELS									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Services complémentaires cartes CPTAQ TCI	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	750,66 \$	750,66 \$	750,66 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Rapport inventaire forestier stationnements CPTAQ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 955,39 \$	1 955,39 \$	1 955,39 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Services complémentaires décision CPTAQ TCI	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	800,53 \$	800,53 \$	800,53 \$	Oui
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Caractérisation milieux naturels sentiers pédestres	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 933,74 \$	1 933,74 \$	1 933,74 \$	Oui
AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	Débroussaillage digue marais Canards illimités	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	656,17 \$	656,17 \$	656,17 \$	Oui
TEMPS RESSOURCES - CONTRIBUTIONS MRC									
MRC de Drummond	2022-2023	MRC de Drummond	Organisme municipal	MRC temps ressources coordonnateur parc régional	Planification et concertation	81 126,00 \$	81 126,00 \$	81 126,00 \$	Oui
ACCESSIBILITÉ ET STATIONNEMENTS									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Rouleaux géotextile stationnement Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	346,46 \$	346,46 \$	346,46 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Tables de pic-nic (5) ancrés sol stationnement Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	8 456,74 \$	8 456,74 \$	8 456,74 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Sonotubes de béton pour tables pic-nic ancrés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	850,40 \$	850,40 \$	850,40 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Fibre de cèdre aire de pic-nic secteur Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	7 827,29 \$	7 827,29 \$	7 827,29 \$	Oui
VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Signalisations pour voies cyclables et piétonnières	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	311,29 \$	311,29 \$	311,29 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Poussière de pierre corridor des Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	8 602,64 \$	8 602,64 \$	8 602,64 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Réaménagement entrée chemin du milieu EXYB	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 680,22 \$	1 680,22 \$	1 680,22 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Réaménagement entrée chemin du milieu EXMF	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	706,04 \$	706,04 \$	706,04 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Power rake détournage voies cyclables chemin milieu	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 881,91 \$	3 881,91 \$	3 881,91 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Tuyau ponceau chemin du milieu connexion Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	996,33 \$	996,33 \$	996,33 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Réparation ponceau connexion Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 482,95 \$	1 482,95 \$	1 482,95 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Ruban adhésif réfléchissant barrière	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	120,74 \$	120,74 \$	120,74 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Cadenas barrière voies cyclables et piétonnières	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	131,36 \$	131,36 \$	131,36 \$	Oui
VÉLO DE MONTAGNE ET VÉLO SUR NEIGE									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #5	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	115 486,25 \$	115 486,25 \$	115 486,25 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #6	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 603,69 \$	2 603,69 \$	2 603,69 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #7	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	209 975,00 \$	209 975,00 \$	209 975,00 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Graphisme panneau d'interdiction aux sentiers vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	104,99 \$	104,99 \$	104,99 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #8	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	122 407,24 \$	122 407,24 \$	122 407,24 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Impression panneau d'interdiction sentiers vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 092,71 \$	1 092,71 \$	1 092,71 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Impression panneau code de conduite sentiers vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	358,64 \$	358,64 \$	358,64 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Vis installation panneaux d'interdiction	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	43,46 \$	43,46 \$	43,46 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement vélo de montagne Sentiers Boréals facture #9	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	104 987,50 \$	104 987,50 \$	104 987,50 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Carte application mobile Ondago sentiers vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	570,24 \$	570,24 \$	570,24 \$	Oui

Outils de communication et d'interprétation									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Avis d'appel d'offres journal Express sentiers pédestre	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	641,47 \$	641,47 \$	641,47 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Frais système d'appel d'offres SEO sentiers pédestre	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	15,71 \$	15,71 \$	15,71 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Coroplast sentiers vélo de montagne conférence de presse	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	119,69 \$	119,69 \$	119,69 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Location chapiteau conférence de presse vélo de montagne	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	577,43 \$	577,43 \$	577,43 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Location hauts-parleurs et microphone conférence de presse vdm	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	157,48 \$	157,48 \$	157,48 \$	Oui
Acquisition de terrain									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Lotissement lot 6 605 531 cession Ville de Drummondville	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 314,75 \$	2 314,75 \$	2 314,75 \$	Oui
Plan d'aménagement et entretien forestier									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Plan d'aménagement forestier unités Drummondville	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	6 044,97 \$	6 044,97 \$	6 044,97 \$	Oui
ÉTUDES, RAPPORTS D'EXPERTISE ET HONORAIRES PROFESSIONNELS									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Recherche historique territoire parc régional Société d'Histoire	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	975,00 \$	975,00 \$	975,00 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Étude potentiel archéologique Bureau Ndakina	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	7 202,88 \$	7 202,88 \$	7 202,88 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Location de salle Le Dauphin activité concertation	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 210,45 \$	2 210,45 \$	2 210,45 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Services juridiques révision appel d'offres sentiers pédestre	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 014,18 \$	1 014,18 \$	1 014,18 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Caractérisation Canot-Kayak-Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 601,07 \$	3 601,07 \$	3 601,07 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Audit de gouvernance facture de 40% RCGT	Planification et concertation	11 338,65 \$	11 338,65 \$	11 338,65 \$	Oui
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	Audit de gouvernance facture de 60% RCGT	Planification et concertation	17 007,98 \$	17 007,98 \$	17 007,98 \$	Oui
TEMPS RESSOURCES - CONTRIBUTION MRC									
MRC de Drummond	2023-2024	MRC de Drummond	Organisme municipal	MRC temps ressources coordonnateur parc régional	Planification et concertation	80 469,54 \$	80 469,54 \$	80 469,54 \$	Oui
ACCESSIBILITÉ ET STATIONNEMENTS									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Travaux porte d'entrée secteur St-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 223,12 \$	3 223,12 \$	3 223,12 \$	Oui
VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Correctifs poussière de pierre boucle Érables argentés	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	3 447,31 \$	3 447,31 \$	3 447,31 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Voies cyclables et piétonnières rive Ouest	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	17 675,70 \$	17 675,70 \$	17 675,70 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Voies cyclables-piétonnières secteur St-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	13 025,30 \$	13 025,30 \$	13 025,30 \$	Oui
Outils de communication et d'interprétation									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Avis d'appel d'offres journal Express sentiers pédestre #1	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	641,47 \$	641,47 \$	641,47 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Avis d'appel d'offres journal Express sentiers pédestre #2	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	641,47 \$	641,47 \$	641,47 \$	Oui
Acquisition de terrain									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Acquisition lot 4 633 522 du MTQ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	9 599,36 \$	9 599,36 \$	9 599,36 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Frais de notaire acquisition lot 4 633 522 MTQ	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 259,75 \$	2 259,75 \$	2 259,75 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Frais d'arpentage correction au plan acquisition Hydro-Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	1 154,86 \$	1 154,86 \$	1 154,86 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Frais de notaire acquisition Hydro-Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	2 259,75 \$	2 259,75 \$	2 259,75 \$	Oui

ÉTUDES, RAPPORTS D'EXPERTISE ET HONORAIRES PROFESSIONNELS									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Rapport technique sentier pédestre - Rando Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	4 902,24 \$	4 902,24 \$	4 902,24 \$	Oui
TEMPS RESSOURCES - CONTRIBUTION MRC									
MRC de Drummond	2024-2025	MRC de Drummond	Organisme municipal	Temps ressources coordonnateur parc régional 2024	Planification et concertation	82 065,00 \$	82 065,00 \$	82 065,00 \$	Oui
						- \$	- \$		
VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNIÈRES									
						- \$	- \$		
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Criblure de pierre chemin du Milieu	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	31 342,87 \$	31 342,87 \$	31 342,87 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Plan de signalisation Baere : facture totale	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	67 349,17 \$	67 349,17 \$	67 349,17 \$	Oui
RANDONNÉE PÉDESTRE									
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Travaux abattage de sécurité sentiers pédestre	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	25 197,00 \$	25 197,00 \$	25 197,00 \$	Oui
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Aménagement réseau de sentiers randonnée pédestre	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	671 728,40 \$	671 728,40 \$	671 728,40 \$	Oui
AIRE DE REPOS ET D'OBSERVATION									
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Aire de repos à Saint-Bonaventure	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	30 823,94 \$	30 823,94 \$	30 823,94 \$	Oui
ÉTUDES, RAPPORTS D'EXPERTISE ET HONORAIRES PROFESSIONNELS									
MRC de Drummond	2024-2025	2025-2026 MRC de Drummond	Organisme municipal	Caractérisation rivière Saint-François Canot Kayak Québec	Projet d'amélioration des services ou d'équipements	6 389,27 \$	6 389,27 \$	6 389,27 \$	Oui
